

4479

Акт № 25
о приеме сдачи выполненных работ
по Договору № 10-7/155-22 от 06.07.2022г.

г. Бендеры

26 октября 2022 г.

МУП «ЖЭУК г. Бендеры», в лице директора Голубнюк Александра Николаевича, действующего на основании Устава предприятия, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **ООО «Группа компаний «Омега»**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Захарова Игоря Матвеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Подписали настоящий Акт в том, что Исполнитель выполнил по поручению Заказчика работы по ремонту фасада объекта муниципального жилищного фонда города Бендеры, находящегося по адресу: ул. Бендерского восстания д. 17

№	Наименование работы (услуги)	Цена (руб.)	Количество (м.п.)	Итого к оплате (руб.)
1	Герметизация межпанельных швов	111	418,5	46 453,50

4

Стоимость работ, выполненных за данный период составляет **46 453 руб. 50 коп.** (*сорок шесть тысяч четыреста пятьдесят три руб. 50 коп.*)

По настоящему Акту Исполнителю подлежит перечислению сумма в размере 100% указанной стоимости работ, в соответствии с п. 2.3. Контракта №10-7/155-22 от 06.07.2022 года.

Данная сумма указана с учетом всех причитающихся к удержанию сумм налогов и вычетов, предусмотренных действующим законодательством ПМР.

Исполнитель выполнил работу, а Заказчик принял ее. Работа выполнена Исполнителем в соответствии с Контрактом № 10-7/155-22 от 06.07.2022г. на выполнение работ по «Текущему ремонту межпанельных швов в домах муниципального жилищного фонда расположенного на территории г. Бендеры»

Работа выполненная Исполнителем отвечает требованиям, предъявляемым Контрактом, выполнена в оговоренные сроки и надлежащим образом. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Вместе с Актом №25 о приеме сдачи выполненных работ прилагаются следующие документы:

1. Акты освидетельствования скрытых работ.


АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН


<p>МУП "ЖЭУК г. Бендеры" Фискальный код: 0300046094 Расчетный счет: 2211670000000010 Банк: ОАО «Эксимбанк» Бендерский филиал</p> <p>Адрес: г. Бендеры, ул. Калинина, 38</p> <p>Директор  А.Н. Голубнюк</p>	<p>ООО «Группа компаний «Омега» Фискальный код: 200046174 Расчетный счет: 2212160000012191 Банк: ЗАО «Агропромбанк», г. Тирасполь КУБ 16, кор. счет: 20210000087</p> <p>3300, г. Тирасполь, ул. К. Либкнехта, д. 78, кв.10</p> <p>Директор  Захаров И.М.</p>
---	--

Работы принял:


(расшифровка подписи)


(подпись)



Нач. ПТО  Рогизный В. В.

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ № 25-1

г. Бендеры

26 октября 2022 г.

по герметизации межпанельных швов
выполненных в жилом доме по улице ул. Бендерского восстания д. 17

Комиссия в составе:

Представитель строительно-монтажной организации:

Романенко А.В., инженер по строительству ООО «Группа компаний «Омега»

Представитель ПТО МУП «ЖЭУК г. Бендеры»: *Рогизный В.И.*

Управляющий ДУ: *Антипова Т.Ю.*

произвели осмотр работ, выполненных *ООО «Группа компаний «Омега»*
и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К приемке предъявлены следующие работы:

- 1) Зачистка межпанельных швов в количестве 381 м.п.;
- 2) Штукатурка межпанельных швов в количестве 104 м.п.;
- 3) Грунтовка межпанельных швов в количестве 418,5 м.п.;

2. При выполнении работ применены: *щетки, шпателя, молотки, кисти, штукатурная смесь, кварц-грунт.*

3. При выполнении работ отсутствуют отклонения от проектно-сметной документации, Задания Заказчика и Сметы.

4. Дата начала работ: 25 октября 2022 года.


5. Дата окончания работ: 26 октября 2022 года.


Решение комиссии:

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, заданием Заказчика и сметой, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по герметизации швов в жилом доме по улице ул. Бендерского восстания д. 17

Представитель ПТО МУП «ЖЭУК г.Бендеры »:


(расшифровка подписи)


(подпись)


Управляющий ДУ:

(расшифровка подписи)

(подпись)

Представитель ремонтной бригады:

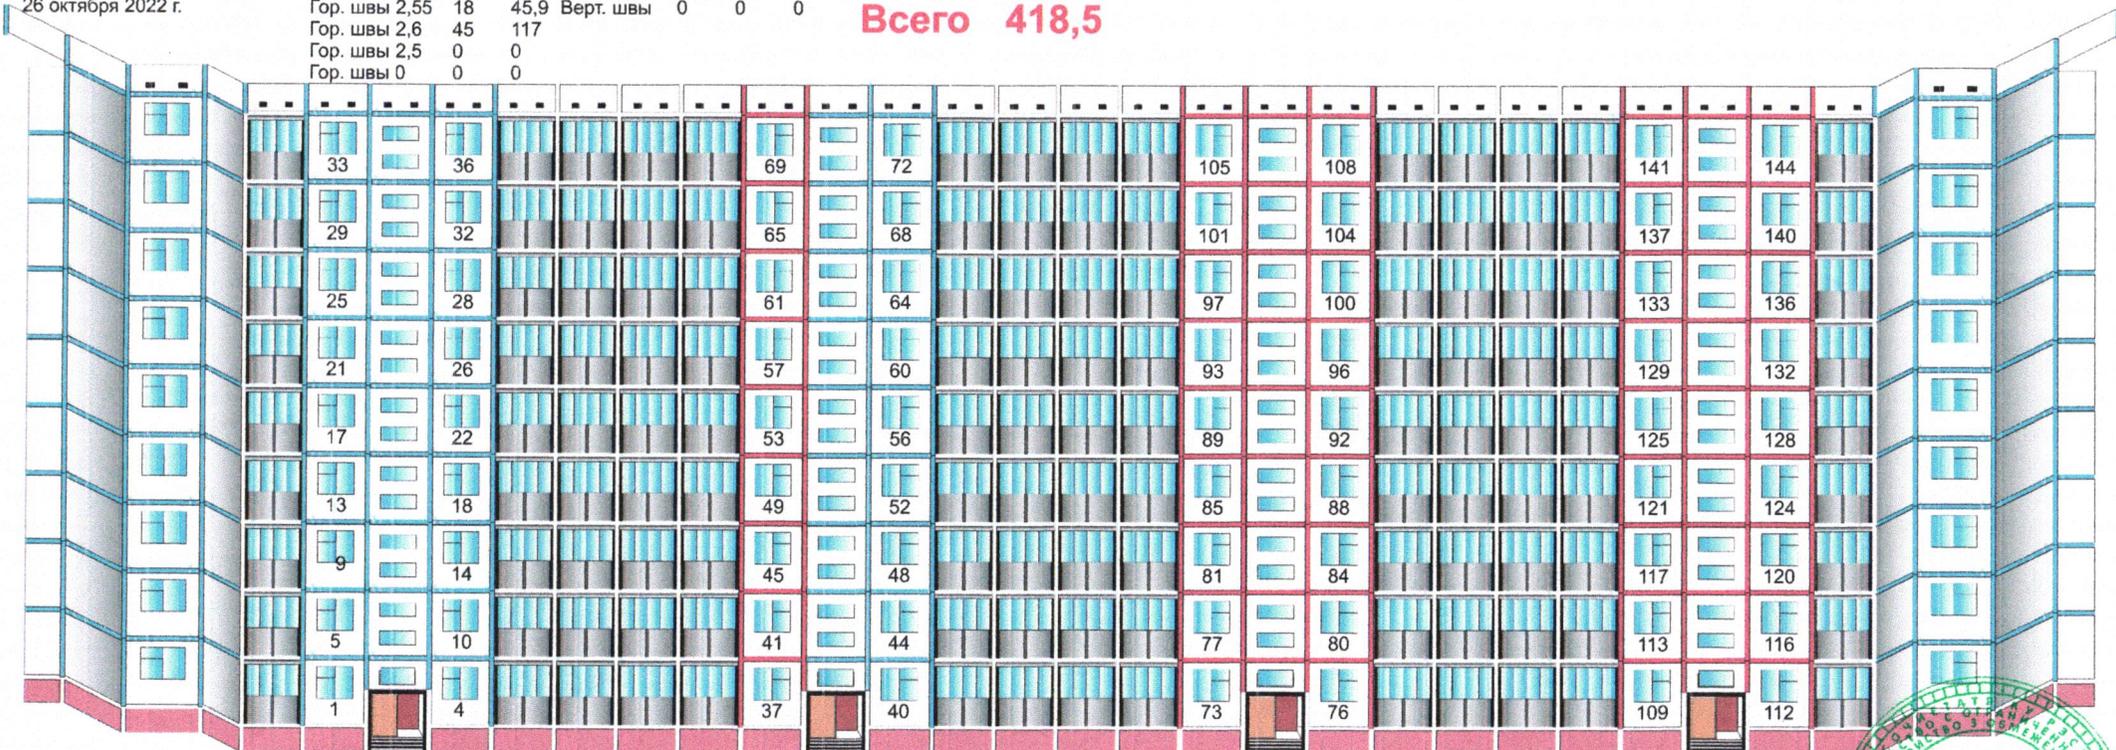
Романенко А.В.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Бендеры
ул. Бендерского востания д. 17
26 октября 2022 г.

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ

Гор. швы 9,9	0	0	Верт. швы 1,5	10	15	Лицевая часть	418,5
Гор. швы 7,8	0	0	Верт. швы 2,75	87,5	240,6	Тыльная часть	0
Гор. швы 2,55	18	45,9	Верт. швы 0	0	0	Всего	418,5
Гор. швы 2,6	45	117					
Гор. швы 2,5	0	0					
Гор. швы 0	0	0					



Акт № 24
о приеме сдачи выполненных работ
по Договору № 10-7/155-22 от 06.07.2022г.

4479

г. Бендеры

24 октября 2022 г.

МУП «ЖЭУК г. Бендеры», в лице директора Голубнюк Александра Николаевича, действующего на основании Устава предприятия, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **ООО «Группа компаний «Омега»**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Захарова Игоря Матвеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Подписали настоящий Акт в том, что Исполнитель выполнил по поручению Заказчика работы по ремонту фасада объекта муниципального жилищного фонда города Бендеры, находящегося по адресу: ул. Кишиневская д. 115

№	Наименование работы (услуги)	Цена (руб.)	Количество (м.п.)	Итого к оплате (руб.)
1	Герметизация межпанельных швов	111	75	8325

Стоимость работ, выполненных за данный период составляет **8325 руб. 00 коп.** (восемь тысяч триста двадцать пять руб. 00 коп.)

По настоящему Акту Исполнителю подлежит перечислению сумма в размере 100% указанной стоимости работ, в соответствии с п. 2.3. Контракта №10-7/155-22 от 06.07.2022 года.

Данная сумма указана с учетом всех причитающихся к удержанию сумм налогов и вычетов, предусмотренных действующим законодательством ПМР.

Исполнитель выполнил работу, а Заказчик принял ее. Работа выполнена Исполнителем в соответствии с Контрактом № 10-7/155-22 от 06.07.2022г. на выполнение работ по «Текущему ремонту межпанельных швов в домах муниципального жилищного фонда расположенного на территории г. Бендеры»

Работа выполненная Исполнителем отвечает требованиям, предъявляемым Контрактом, выполнена в оговоренные сроки и надлежащим образом. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.


Вместе с Актом № 24 о приеме сдачи выполненных работ прилагаются следующие документы:

1. Акты освидетельствования скрытых работ.


АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

<p>МУП "ЖЭУК г. Бендеры" Фискальный код: 0300046094 Расчетный счет: 2211670000000010 Банк: ОАО «Эксимбанк» Бендерский филиал</p> <p>Адрес: г. Бендеры, ул. Калинина, 38</p> <p>Директор  А.Н. Голубнюк</p> 	<p>ООО «Группа компаний «Омега» Фискальный код: 200046174 Расчетный счет: 2212160000012191 Банк: ЗАО «Агропромбанк», г. Тирасполь КУБ 16, кор. счет: 20210000087</p> <p>3300, г. Тирасполь, ул. К. Либкнехта, д. 78, кв.10</p> <p>Директор  Захаров И.М.</p> 
---	---

Работы принял:


(расшифровка подписи)


(подпись)


Иск. ПТО  РПЧЗНЫІІ 

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ № 24-1

г. Бендеры

24 октября 2022 г.

по герметизации межпанельных швов
выполненных в жилом доме по улице ул. Кишиневская д. 115

Комиссия в составе:

Представитель строительно-монтажной организации:

Романенко А.В., инженер по строительству ООО «Группа компаний «Омега»

Представитель ПТО МУП «ЖЭУК г. Бендеры»: Рогизный В.И.

Управляющий ДУ: Видрашко Д.И.

произвели осмотр работ, выполненных ООО «Группа компаний «Омега»
и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К приемке предъявлены следующие работы:

- 1) Зачистка межпанельных швов в количестве 54 м.п.;
- 2) Штукатурка межпанельных швов в количестве 21 м.п.;
- 3) Грунтовка межпанельных швов в количестве 75 м.п.;

2. При выполнении работ применены: щетки, шпателя, молотки, кисти, штукатурная смесь, кварц-грунт.

3. При выполнении работ отсутствуют отклонения от проектно-сметной документации, Задания Заказчика и Сметы.

4. Дата начала работ: 21 октября 2022 года.

5. Дата окончания работ: 24 октября 2022 года.


Решение комиссии:

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, заданием Заказчика и сметой, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по герметизации швов в жилом доме по улице ул. Кишиневская д. 115

Представитель ПТО МУП «ЖЭУК г. Бендеры »:


(расшифровка подписи)


(подпись)

Управляющий ДУ:


(расшифровка подписи)

(подпись)

Представитель ремонтной бригады:


(расшифровка подписи)


(подпись)





Акт № 23
о приеме сдачи выполненных работ
по Договору № 10-7/155-22 от 06.07.2022г.

4479

г. Бендеры

24 октября 2022 г.

МУП «ЖЭУК г. Бендеры», в лице директора Голубнюк Александра Николаевича, действующего на основании Устава предприятия, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **ООО «Группа компаний «Омега»**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Захарова Игоря Матвеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Подписали настоящий Акт в том, что Исполнитель выполнил по поручению Заказчика работы по ремонту фасада объекта муниципального жилищного фонда города Бендеры, находящегося по адресу: ул. Интернационалистов д. 15

№	Наименование работы (услуги)	Цена (руб.)	Количество (м.п.)	Итого к оплате (руб.)
1	Герметизация межпанельных швов	111	124,1	13 775,10

Стоимость работ, выполненных за данный период составляет **13 775 руб. 10 коп.** (*тринадцать тысяч семьсот семьдесят пять руб. 10 коп.*)

По настоящему Акту Исполнителю подлежит перечислению сумма в размере 100% указанной стоимости работ, в соответствии с п. 2.3. Контракта №10-7/155-22 от 06.07.2022 года.

Данная сумма указана с учетом всех причитающихся к удержанию сумм налогов и вычетов, предусмотренных действующим законодательством ПМР.

Исполнитель выполнил работу, а Заказчик принял ее. Работа выполнена Исполнителем в соответствии с Контрактом № 10-7/155-22 от 06.07.2022г. на выполнение работ по «Текущему ремонту межпанельных швов в домах муниципального жилищного фонда расположенного на территории г. Бендеры»


Работа выполненная Исполнителем отвечает требованиям, предъявляемым Контрактом, выполнена в оговоренные сроки и надлежащим образом. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.


Вместе с Актом № 23 о приеме сдачи выполненных работ прилагаются следующие документы:

1. Акты освидетельствования скрытых работ.

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

<p>МУП "ЖЭУК г. Бендеры" Фискальный код: 0300046094 Расчетный счет: 2211670000000010 Банк: ОАО «Эксимбанк» Бендерский филиал</p> <p>Адрес: г. Бендеры, ул. Калинина, 38</p> <p>Директор  А.Н. Голубнюк</p> 	<p>ООО «Группа компаний «Омега» Фискальный код: 200046174 Расчетный счет: 2212160000012191 Банк: ЗАО «Агропромбанк», г. Тирасполь КУБ 16, кор. счет: 20210000087</p> <p>3300, г. Тирасполь, ул. К. Либкнехта, д. 78, кв.10</p> <p>Директор  Захаров И.М.</p> 
---	---

Работы принял:  
(расшифровка подписи) (подпись)

 /  (подпись)
Нах. ПТО  /  /  / 

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ № 23-1

г. Бендеры

24 октября 2022 г.

по герметизации межпанельных швов
выполненных в жилом доме по улице *Интернационалистов д. 15*

Комиссия в составе:

Представитель строительно-монтажной организации:

Романенко А.В., инженер по строительству ООО «Группа компаний «Омега»

Представитель ПТО МУП «ЖЭУК г. Бендеры»: *Рогизный В.И.*

Управляющий ДУ: *Видрашко Д.И.*

произвели осмотр работ, выполненных *ООО «Группа компаний «Омега»*
и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К приемке предъявлены следующие работы:

- 1) Зачистка межпанельных швов в количестве 96 м.п.;
- 2) Штукатурка межпанельных швов в количестве 47 м.п.;
- 3) Грунтовка межпанельных швов в количестве 124,1 м.п.;

2. При выполнении работ применены: *щетки, шпателя, молотки, кисти, штукатурная смесь, кварц-грунт.*

3. При выполнении работ отсутствуют отклонения от проектно-сметной документации, Задания Заказчика и Сметы.

4. Дата начала работ: 21 октября 2022 года.

5. Дата окончания работ: 24 октября 2022 года.

Решение комиссии:

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, заданием Заказчика и сметой, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по герметизации швов в жилом доме по улице *Интернационалистов д. 15*

Представитель ПТО МУП «ЖЭУК г. Бендеры»:

Видрашко Д.И.
(расшифровка подписи)

Рогизный В.И.
(подпись)

Управляющий ДУ:

(расшифровка подписи)

(подпись)

Представитель ремонтной бригады:

Романенко А.В.
(расшифровка подписи)

Видрашко Д.И.
(подпись)

Видрашко Д.И.

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ

Бендеры
ул. Интернационалистов д. 9
24 октября 2022 г.

Гор. швы 9,9	1	9,9	Верт. швы	1,5	5	7,5
Гор. швы 7,8	1	7,8	Верт. швы	2,75	26,5	72,9
Гор. швы 2,55	0	0	Верт. швы	0	0	0
Гор. швы 2,6	10	26				
Гор. швы 2,5	0	0				
Гор. швы 0	0	0				

Лицевая часть 124,1
Тыльная часть 0
Всего 124,1

