

Акт № 22
о приеме сдачи выполненных работ
по Договору № 10-7/155-22 от 06.07.2022г.

г. Бендеры

9 ноября 2022 г.

МУП «ЖЭУК г. Бендеры», в лице директора Голубнюк Александра Николаевича, действующего на основании Устава предприятия, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **ООО «Группа компаний «Омега»**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Захарова Игоря Матвеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Подписали настоящий Акт в том, что Исполнитель выполнил по поручению Заказчика работы по ремонту фасада объекта муниципального жилищного фонда города Бендеры, находящегося по адресу: ул. Старого д. 9

№	Наименование работы (услуги)	Цена (руб.)	Количество (м.п.)	Итого к оплате (руб.)
1	Герметизация межпанельных швов	111	141,45	15 700,95

Стоимость работ, выполненных за данный период составляет **15 700 руб. 95 коп. (пятнадцать тысяч семьсот руб. 95 коп.)**

По настоящему Акту Исполнителю подлежит перечислению сумма в размере 100% указанной стоимости работ, в соответствии с п. 2.3. Контракта №10-7/155-22 от 06.07.2022 года.

Данная сумма указана с учетом всех причитающихся к удержанию сумм налогов и вычетов, предусмотренных действующим законодательством ПМР.

Исполнитель выполнил работу, а Заказчик принял ее. Работа выполнена Исполнителем в соответствии с Контрактом № 10-7/155-22 от 06.07.2022г. на выполнение работ по «Текущему ремонту межпанельных швов в домах муниципального жилищного фонда расположенного на территории г. Бендеры»

Работа выполненная Исполнителем отвечает требованиям, предъявляемым Контрактом, выполнена в оговоренные сроки и надлежащим образом. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Вместе с Актом №22 о приеме сдачи выполненных работ прилагаются следующие документы:

1. Акты освидетельствования скрытых работ.



АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

<p>МУП "ЖЭУК г. Бендеры" Фискальный код: 0300046094 Расчетный счет: 2211670000000010 Банк: ОАО «Эксимбанк» Бендерский филиал</p> <p>Адрес: г. Бендеры, ул. Калинина, 38</p> <p>Директор  А.Н. Голубнюк</p>	<p>ООО «Группа компаний «Омега» Фискальный код: 200046174 Расчетный счет: 2212160000012191 Банк: ЗАО «Агропромбанк», г. Тирасполь КУБ 16, кор. счет: 20210000087</p> <p>3300, г. Тирасполь, ул. К. Либкнехта, д. 78, кв. 10</p> <p>Директор  Захаров И.М.</p>
---	---

Работы принял:


(расшифровка подписи)


(подпись)

Нач. ПТО  /  / 
 /  / 

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ № 22-1

г. Бендеры

24 октября 2022 г.

по герметизации межпанельных швов
выполненных в жилом доме по улице *Старого д. 9*

Комиссия в составе:

Представитель строительно-монтажной организации:

Романенко А.В., инженер по строительству ООО «Группа компаний «Омега»

Представитель ПТО МУП «ЖЭУК г. Бендеры»: *Рогизный В.И.*

Управляющий ДУ: *Видрашко Д.И.*

произвели осмотр работ, выполненных ООО «Группа компаний «Омега»
и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К приемке предъявлены следующие работы:

- 1) Зачистка межпанельных швов в количестве 91 м.п.;
- 2) Штукатурка межпанельных швов в количестве 33 м.п.;
- 3) Грунтовка межпанельных швов в количестве 141,45 м.п.;

2. При выполнении работ применены: *щетки, шпателя, молотки, кисти, штукатурная смесь, кварц-грунт.*

3. При выполнении работ отсутствуют отклонения от проектно-сметной документации, Задания Заказчика и Сметы.

4. Дата начала работ: 21 октября 2022 года.

5. Дата окончания работ: 24 октября 2022 года.

Решение комиссии:

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, заданием Заказчика и сметой, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по герметизации швов в жилом доме по улице *Старого д. 9*

Представитель ПТО МУП «ЖЭУК г. Бендеры »:

Рогизный В.И.
(расшифровка подписи)

Видрашко Д.И.
(подпись)

Управляющий ДУ:

(расшифровка подписи)

(подпись)

Представитель ремонтной бригады:

Романенко А.В.
(расшифровка подписи)

Р.В.
(подпись)

Над-к ЖЭУ

Видрашко Д.И.

Андрей / Суфенов

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ


Бендеры
ул. Старого д. 9
24 октября 2022 г.

Гор. швы 9,9	0	0
Гор. швы 7,8	0	0
Гор. швы 2,55	0	0
Гор. швы 2,1	8	16,8
Гор. швы 2,5	9	22,5
Гор. швы 0	0	0

Верт. швы 1,5	1	1,5
Верт. швы 2,75	9	24,75
Верт. швы 0	0	0

Лицевая часть 65,55
Тыльная часть 75,9

Всего 141,45

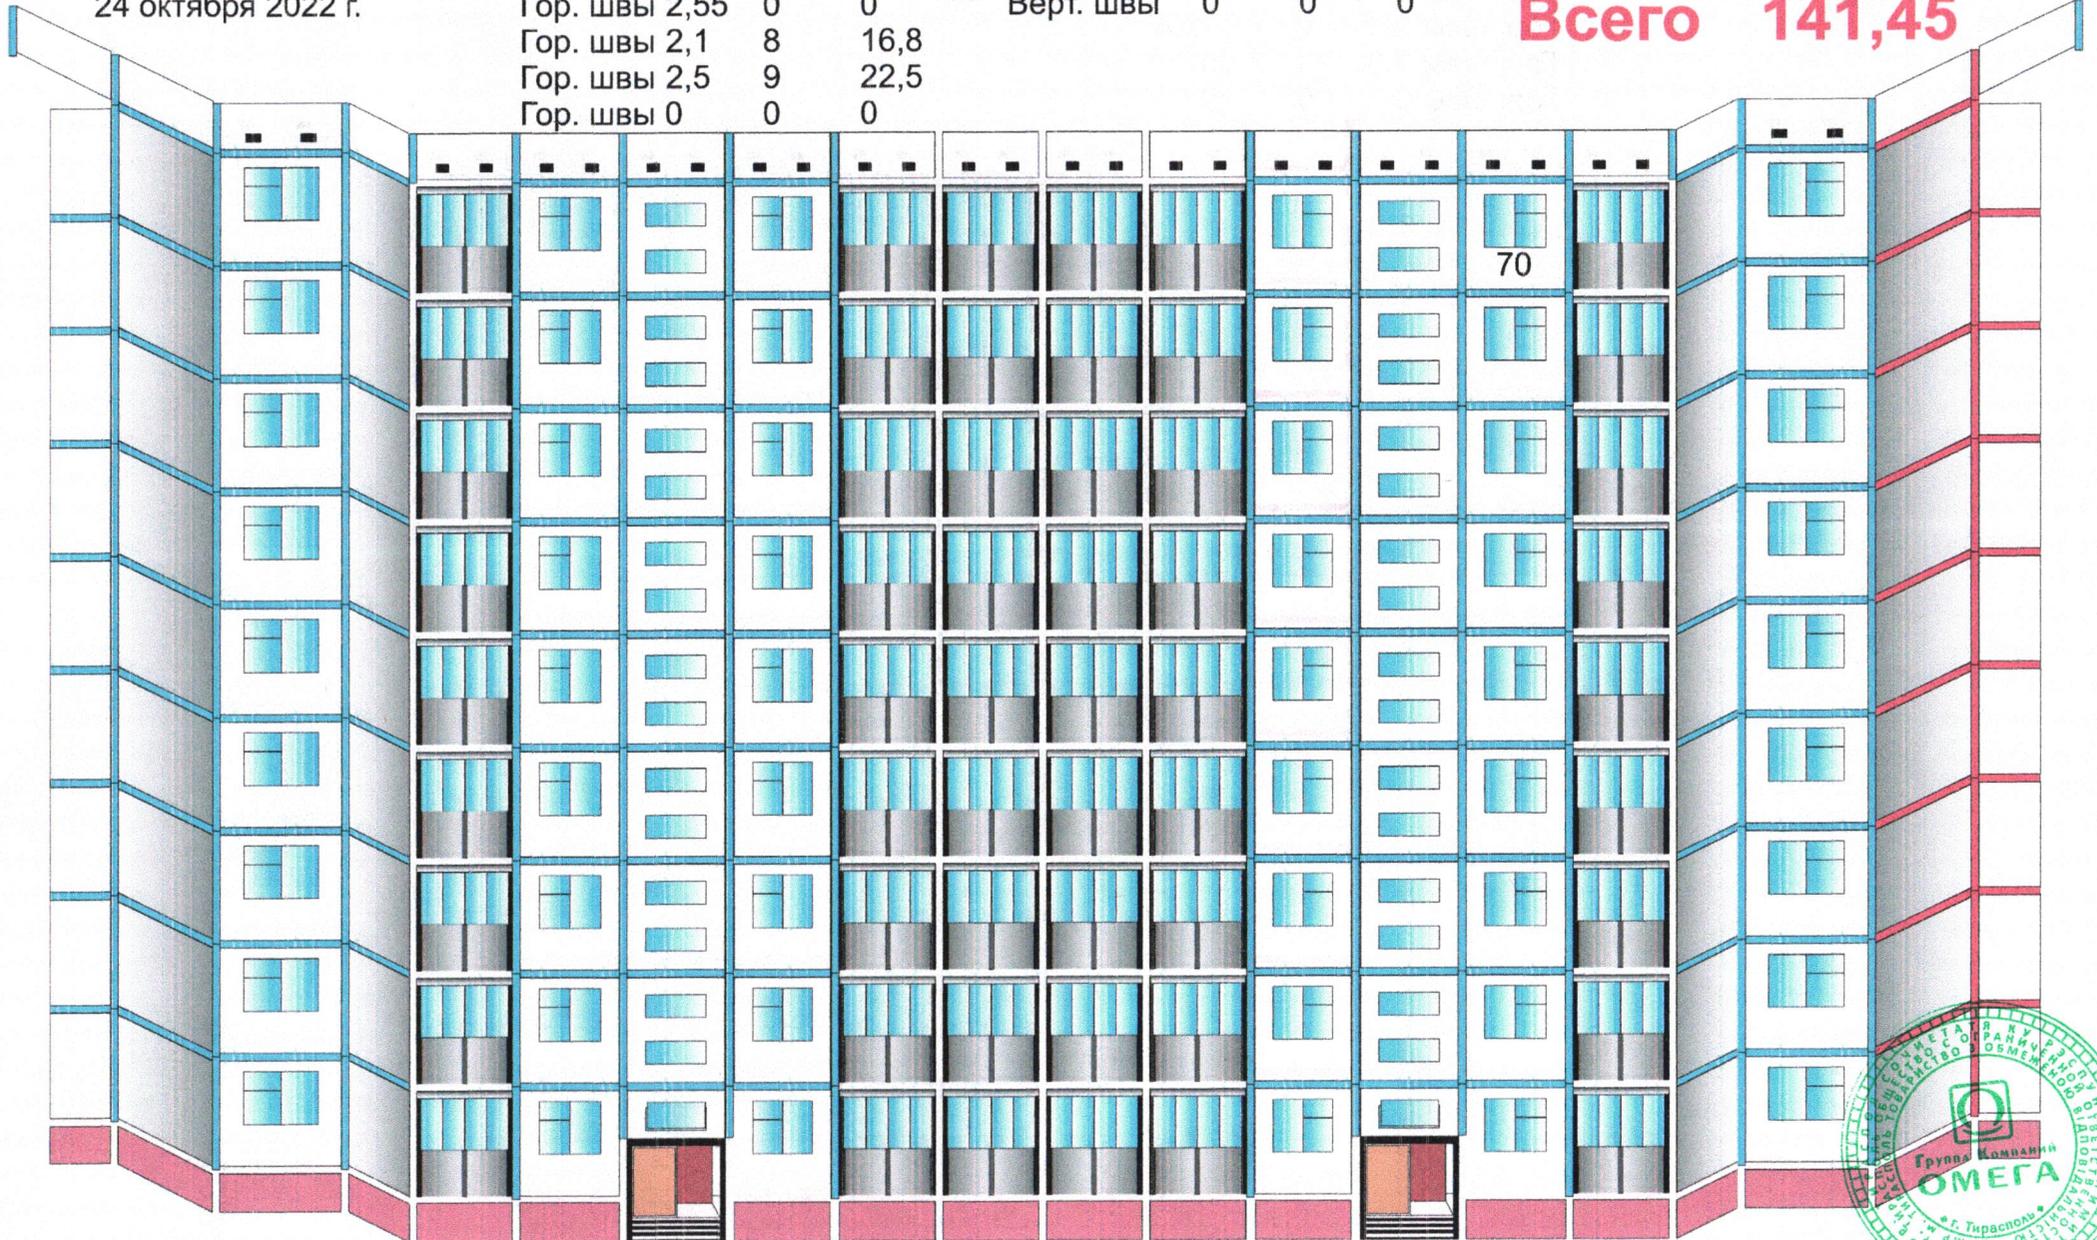



ТЫЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Бендеры
ул. Старого д. 9
24 октября 2022 г.

Гор. швы 9,9	0	0
Гор. швы 7,8	0	0
Гор. швы 2,55	0	0
Гор. швы 2,6	9	23,4
Гор. швы 2,5	0	0
Гор. швы 0	0	0

Верт. швы 1,5	2	3
Верт. швы 2,75	18	49,5
Верт. швы 0	0	0

Тыльная часть 75,9 м/п

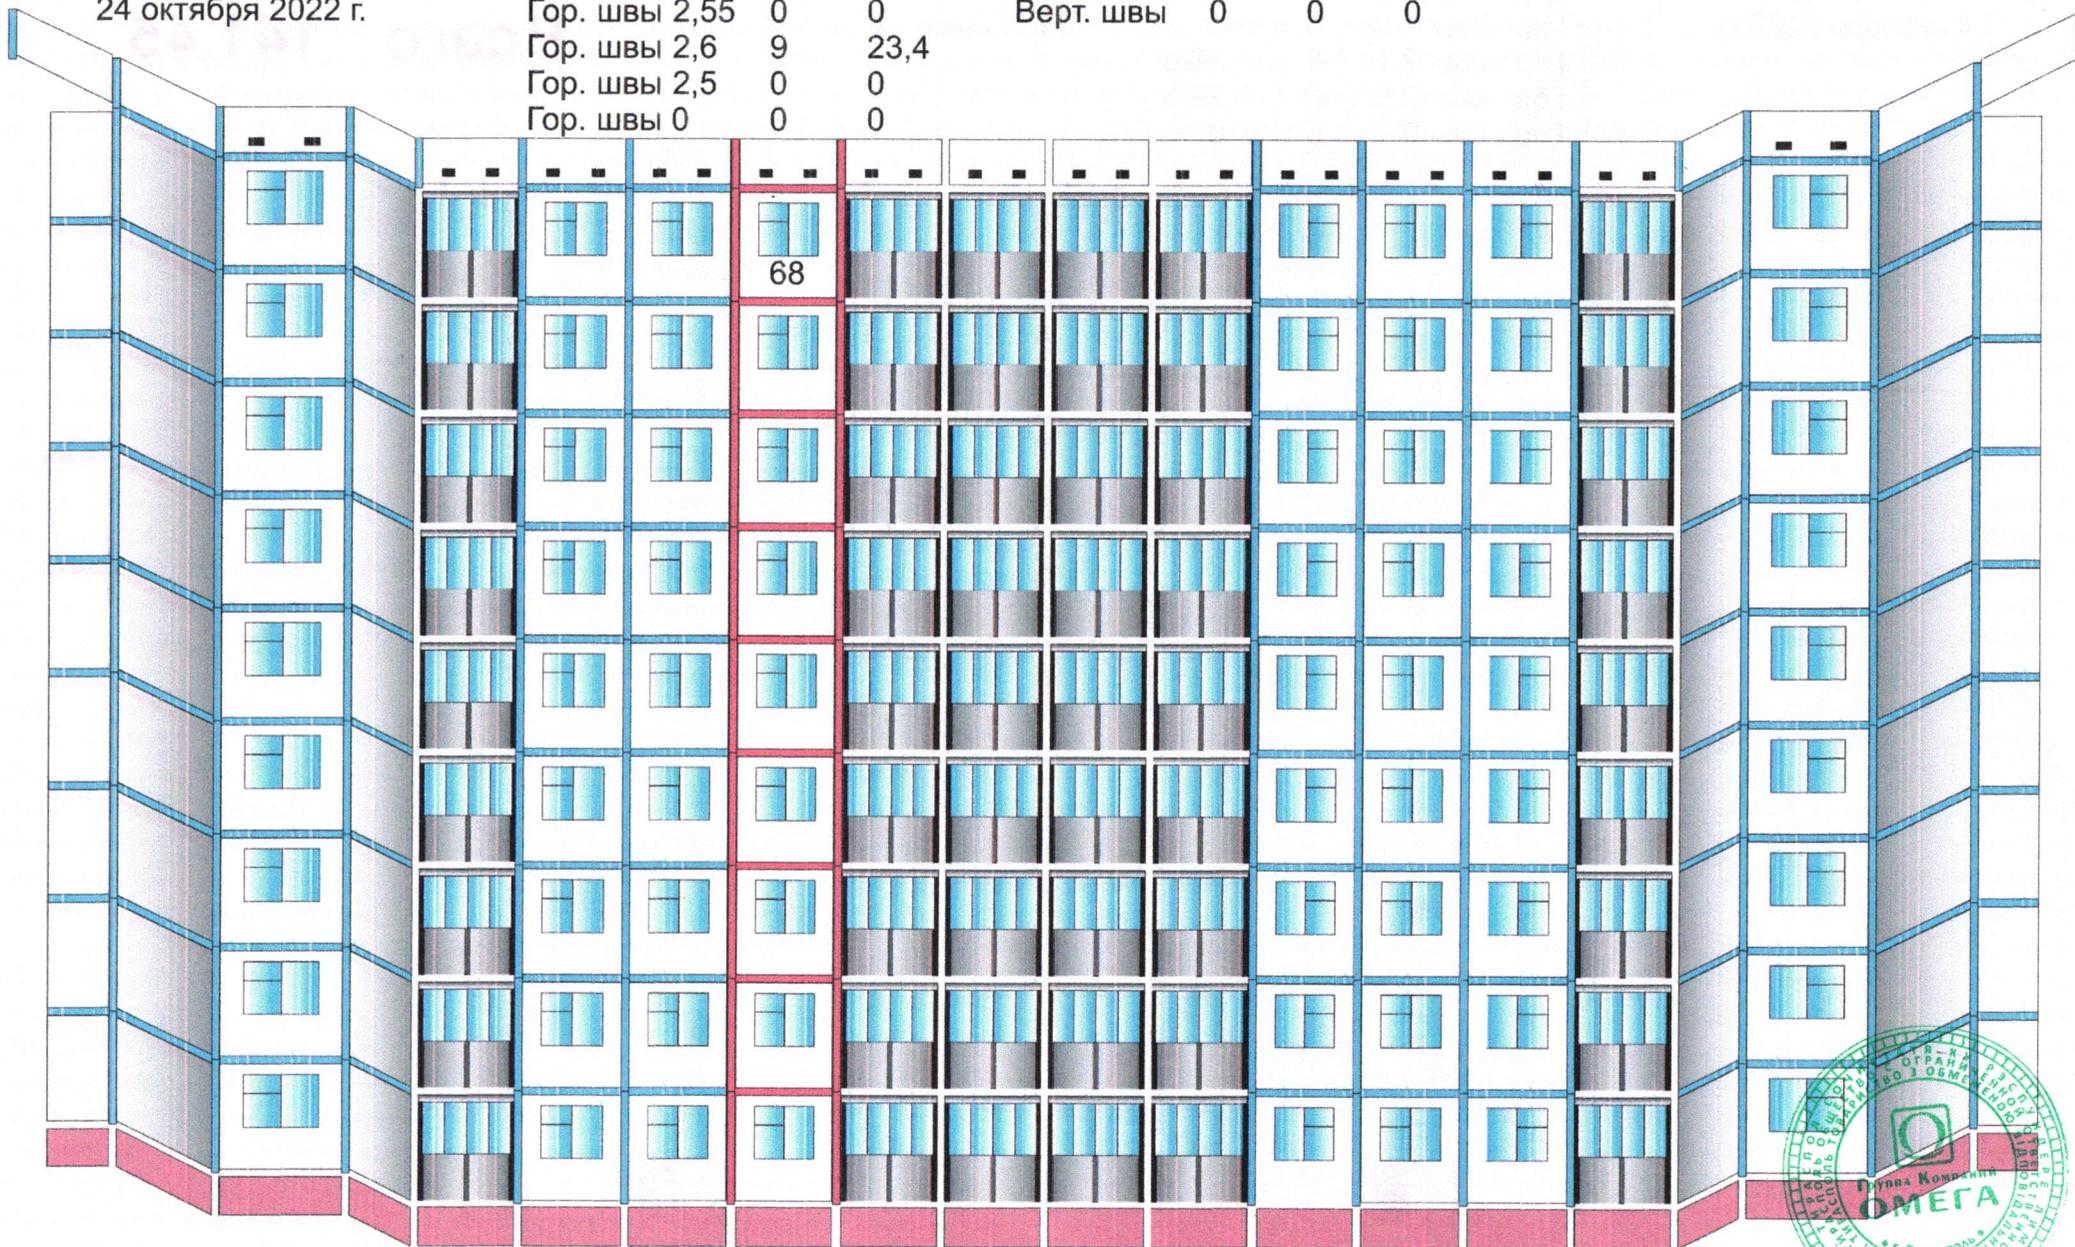

Акт № 26
о приеме сдачи выполненных работ
по Договору № 10-7/155-22 от 06.07.2022г.

г. Бендеры

9 ноября 2022 г.

МУП «ЖЭУК г. Бендеры», в лице директора Голубнюк Александра Николаевича, действующего на основании Устава предприятия, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Группа компаний «Омега», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Захарова Игоря Матвеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Подписали настоящий Акт в том, что Исполнитель выполнил по поручению Заказчика работы по ремонту фасада объекта муниципального жилищного фонда города Бендеры, находящегося по адресу: ул. Индустриальная д. 101 А

№	Наименование работы (услуги)	Цена (руб.)	Количество (м.п.)	Итого к оплате
1	Герметизация межпанельных швов	111	610,3	67 743,3

Стоимость работ, выполненных за данный период составляет **67 743 руб. 30 коп. (шестьдесят семь тысяч семьсот сорок три руб. 30 коп.)**

По настоящему Акту Исполнителю подлежит перечислению сумма в размере 100% указанной стоимости работ, в соответствии с п. 2.3. Контракта №10-7/155-22 от 06.07.2022 года.

Данная сумма указана с учетом всех причитающихся к удержанию сумм налогов и вычетов, предусмотренных действующим законодательством ПМР.


Исполнитель выполнил работу, а Заказчик принял ее. Работа выполнена Исполнителем в соответствии с Контрактом № 10-7/155-22 от 06.07.2022г. на выполнение работ по «Текущему ремонту межпанельных швов в домах муниципального жилищного фонда расположенного на территории г. Бендеры»

Работа выполненная Исполнителем отвечает требованиям, предъявляемым Контрактом, выполнена в оговоренные сроки и надлежащим образом. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Вместе с Актом № 26 о приеме сдачи выполненных работ прилагаются следующие документы:

1. Акты освидетельствования скрытых работ.

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

<p>МУП "ЖЭУК г. Бендеры" Фискальный код: 0300046094 Расчетный счет: 2211670000000010 Банк: ОАО «Эксимбанк» Бендерский филиал</p> <p>Адрес: г. Бендеры, ул. Калинина, 38</p> <p>Директор  А.Н. Голубнюк</p> 	<p>ООО «Группа компаний «Омега» Фискальный код: 200046174 Расчетный счет: 2212160000012191 Банк: ЗАО «Агропромбанк», г. Тирасполь КУБ 16, кор. счет: 20210000087</p> <p>3300, г. Тирасполь, ул. К. Либкнехта, д. 78, кв.10</p> <p>Директор  Захаров И.М.</p> 
---	---

Работы принял: _____
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)

Нач. ПТО  В.В. Рогизный

 / 

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ № 26-1

г. Бендеры

31 октября 2022 г.

по герметизации межпанельных швов
выполненных в жилом доме по улице ул. Индустриальная д. 101 А

Комиссия в составе:

Представитель строительно-монтажной организации:

Романенко А.В., инженер по строительству ООО «Группа компаний «Омега»

Представитель ПТО МУП «ЖЭУК г. Бендеры»: *Рогизный В.И.*

Управляющий ДУ: *Оторубчак Т.А.*

произвели осмотр работ, выполненных ООО «Группа компаний «Омега»
и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К приемке предъявлены следующие работы:

- 1) Зачистка межпанельных швов в количестве 576 м.п.;
- 2) Штукатурка межпанельных швов в количестве 205 м.п.;
- 3) Грунтовка межпанельных швов в количестве 610,3 м.п.;

2. При выполнении работ применены: *щетки, шпателя, молотки, кисти, штукатурная смесь, кварц-грунт.*

3. При выполнении работ отсутствуют отклонения от проектно-сметной документации, Задания Заказчика и Сметы.

4. Дата начала работ: 28 октября 2022 года.

5. Дата окончания работ: 31 октября 2022 года.

Решение комиссии:

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, заданием Заказчика и сметой, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по герметизации швов в жилом доме по улице ул. Индустриальная д. 101 А

Представитель ПТО МУП «ЖЭУК г. Бендеры»: *Рогизный В.И.* *Романенко А.В.*
(расшифровка подписи) (подпись)

Управляющий ДУ: _____
(расшифровка подписи) (подпись)

Представитель ремонтной бригады: *Романенко А.В.* *Р.В.*
(расшифровка подписи) (подпись)

Нач-к ЖЭУК-3 Афанасий Акимович Ш. Ш.
Афанасий Акимович Ш. Ш.

ТЫЛЬНАЯ ЧАСТЬ

г. Бендеры
ул. Индустриальная д. 101 А
31 октября 2022 г.

Гор. швы	4,2	17	71,4
Гор. швы	2,75	9	24,75
Гор. швы	3,2	9	28,8
Гор. швы	2,6	35	91
Гор. швы	2,55	17	43,35
Гор. швы	0	0	0

Верт. швы	1,5	14	21
Верт. швы	2,75	120	330
Верт. швы	0	0	0

610,3

